ПРОТОКОЛ № 12

заседания Проектного комитета

Находкинского городского округа

15 сентября 2023 года 15:00 ч.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа Я.В. Кудинова.

Присутствовали: 19 человек. Приложение №1.

---

1. Проект по развитию велосипедной и беговой инфраструктуры в городе Находка.

1.1. Принять к сведению «Проект по развитию велосипедной и беговой инфраструктуры в г. Находка» общественного наблюдателя Нагина С.Ю. Приложение № 2.

1.2. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) при разработке проектно-сметной документации Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, направить в их адрес предложение о включении устройства велосипедных дорожек при строительстве объездных дорог в г. Находка.

---

2. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов с 14.08.2023 года по 15.09.2023 года

2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства Гринько Н.О. о замечаниях общественных наблюдателей по объектам: МБУ ДО «ДШИ № 1», МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова», «Тропа здоровья», стадион в п. Ливадия, сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру». Приложение № 3.

2.2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Подшиваловой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 07.09.2023 г. на объект МБУ ДО «ДШИ № 1» расположенный по адресу: г. Находка, ул. Владивостокская, д. 12, о неаккуратно сделанных стыках, швах на лестничных пролетах и повышенной влажности в некоторых помещениях школы.

2.3. Начальнику управления культуры администрации НГО (Ольшевская Т.В.) проконтролировать работу подрядчика по устранению выявленных замечаний. **Срок исполнения до 28.09.2023 г.**

2.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 07.09.2023 г. на объект МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова», расположенный по адресу: ул. Находкинский проспект, д. 32. В момент выезда на объект установлено, что на фасаде здания местами краска легла неровно, имеются следы ржавчины от установленных металлических конструкций. Для сохранения фасада необходимо удлинить трубу водостока.

2.5. Начальнику управления культуры администрации НГО (Ольшевская Т.В.) усилить контроль за выполнением работ на объекте. **Срок исполнения до 12.10.2023 г.**

2.6. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 04.09.2023 г. на объект по благоустройству стадиона, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2А. При осмотре обнаружены дефекты бордюр и покрытия спортивной площадки, само примыкание бордюр к дорожке выполнено с нарушениями. Установка и окрашивание спортивных тренажеров произведено с дефектами. На объекте присутствует строительный мусор.

2.7. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) усилить контроль за выполнением работ на объекте. **Срок исполнения до 15.10.2023 г.**

2.8. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Нагина С.Ю. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 05.09.2023 г. на объект «Тропа здоровья», расположенного по адресу: г. Находка, ул. Ленинградская, 23. При осмотре объекта выявлено, что на одном участке тропы

три вида покрытия уложено не надёжно, что делает данный участок небезопасным. Фигура семьи из дерева выполнена неаккуратно. Имеются места на тропе, где размыло песок.

2.9. Начальнику управления экономики и инвестиций администрации НГО (Щитов Д.А.) организовать проведение совещания по вопросу о расторжении муниципального контракта по программе инициативное бюджетирование «Твой проект», объект «Тропа здоровья». **Срок исполнения до 21.09.2023 г.**

2.10. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 11.09.2023 г. на объект сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», расположенного по адресу: г. Находка, примерно 250 метров от направления северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова, 2, по укреплению провалившейся брусчатки около ливнестока.

2.11. Начальнику управления благоустройства администрации НГО (Сазонтова И.П.) принять меры по укреплению брусчатки возле основания ливнестока. **Срок исполнения до 18.09.2023 г.**

---

3. Информация по брендированию национальных проектов и объектов плана социального развития центров экономического роста.

3.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства Гринько Н.О. о брендировании национальных объектов и объектов плана социального развития центров экономического роста. Приложение № 4.

3.2. Начальнику управления благоустройства администрации НГО (Сазонтова И.П.) обеспечить установку информационных щитов с использованием фирменного стиля национальных проектов по следующим объектам: видовая площадка № 2; сквер в районе Камня дружбы породненных городов Находка-Майдзуру. **Срок исполнения до 15.10.2023 г.**

3.3. Заместителю главы администрации НГО – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО (Шевченко А.В.) рамках

реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий», необходимо согласовать макеты информационных щитов с министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и обеспечить установку информационных щитов на пятнадцати объектах. **Срок исполнения до 15.10.2023 г.**

3.4. Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО (Арапов О.В.) в рамках реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, необходимо согласовать макеты информационных щитов с министерством физической культуры и спорта Приморского края по следующим объектам: стадион «Водник» и Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

---

4. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы благоустройства сельских территорий на 08 сентября 2023 года.

4.1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. по исполнению бюджета по состоянию на 08.09.2023 года. Приложение №5.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа Я.В. Кудинова

Секретарь Н.О. Гринько

Приложение 1.

СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

15.09.2023 **15:00**

1.	**КУДИНОВА Яна Викторовна**	-	заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
2.	**ШЕВЧЕНКО Антон Владимирович**	-	заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
3.	**ВОРОНИНА Александра Анатольевна**	-	начальник финансового управления Находкинского городского округа;
4.	**ЩИТОВ Денис Андреевич**	-	начальник управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
5.	**КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна**	-	начальник отдела по обеспечению деятельности территории - микрорайона города «поселок Ливадия»;
6.	**ЖУРАВЛЕВА Анжелика Ивановна**	-	заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
7.	**СОЛОВЕЙ Елена Аркадьевна**	-	заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
8.	**ПЕТРОШЕНКО Кристина Алексеевна**	-	начальник отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
9.	**УСТИНОВА Ольга Валентиновна**	-	начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;

10.	**БУРЛАКОВА Ольга Николаевна**	-	заместитель директора МКУ «ЦБМУК» Находкинского городского округа;
11.	**СВИРИДЕНКО Наталья Викторовна**	-	заместитель директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства»;
12.	**ГОЛОВКО Жанна Евгеньевна**	-	ведущий специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа
13.	**ГРИНЬКО Наталья Олеговна**	-	главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
14.	**БЕЛОБОРОДОВА Юлия Валентиновна**	-	общественный наблюдатель;
15.	**БОНДАРЕНКО Александр Валерьевич**	-	общественный наблюдатель;
16.	**ЛЕОНОВА Юлия Викторовна**	-	общественный наблюдатель;
17.	**НАГИН Сергей Юрьевич**	-	общественный наблюдатель;
18.	**ПОДШИВАЛОВА Юлия Вячеславовна**	-	общественный наблюдатель;
19.	**ТЕН Маргарита Константиновна**	-	общественный наблюдатель.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ НАХОДКА


СМОТРЕТЬ



РАЗРАБОТЧИКИ:

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЕГОВОГО КЛУБА “НЕБУДЬКАКГРИША” И СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕЛОКЛУБА “НАХОДКА” 2023 ГОД.



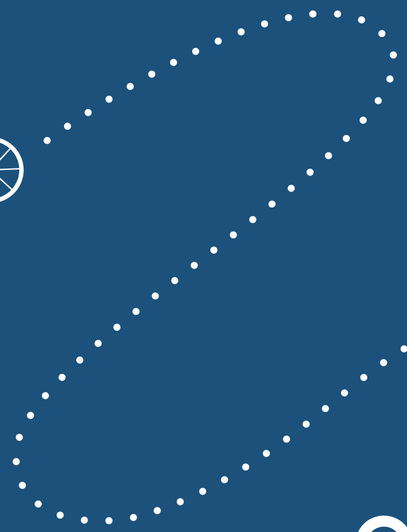



ПРОБЛЕМА

1. УВЕЛИЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБОК

Одна из главных функций велоинфраструктуры − снижение загруженности дорог транспортом. В случае её отсутствия, автомобильные дороги становятся более загруженными в следствии чего возникают пробки, что приведет к негативному психологическому состоянию водителей и увеличению аварийных ситуаций.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

Велосипедная инфраструктура расширяет границы доступности для людей, позволяя им перемещаться на большие расстояния с минимальными усилиями. **Особенно актуально для туристов**. Если такой возможности нет, многие горожане будут вынуждены ограничиться только теми районами, которые доступны им пешком или на общественном транспорте, что может негативно сказаться на развитии города в целом.

3. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

В отсутствие велосипедных дорожек и специальных маршрутов, пользователи велосипедов вынуждены разделять дороги с автомобилями, почти не получая защиты и стабильности на дороге. Это создает опасные ситуации и отвлекать водителей от дорожного движения.

ПРОБЛЕМА

4. СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Велосипед – это экологически чистое средство передвижения, не загрязняющее окружающую среду. В случае отсутствия велоинфраструктуры, большое количество людей предпочтет продолжать использовать автомобили, что повлечет увеличение количества выбросов и загрязнение городской атмосферы. (пыль и воздух).

5. УХУДШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

Велосипедная езда – это отличный способ поддержания физической формы и улучшения общего здоровья. В отсутствие возможностей для велосипедной езды, уровень активности жителей может снизиться, что приведет к возникновению ряда проблем, связанных с общественным здоровьем, например, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

6. ОТСУТСТВИЕ ВЕЛО ПАРКОВОК

В отсутствие велосипедных вело парковок (школы, супермаркеты, остановки, парки ,скверы), даже для людей уже имеющих велосипед. Нет возможности передвигаться с пункта А до пункта В, так как нет места где оставить транспортное средство.

ПРОБЛЕМА

7. ОТТОК СПЕЦИАЛИСТОВ И АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ ИЗ ГОРОДА

Молодым активным людям, а также хорошим специалистам не хватает условий для комфортного проживания с семьей и возможности реализации. Создание комфортной и доступной инфраструктуры очень ценится этой группой людей. Они не поедут в центральные города, предпочтут жить в родном комфортном городе.

8. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ДЛЯ ТУРИСТОВ

При выборе какой город посетить туристу? сам турист выберет тот город который будет иметь уникальность, аутентичность. На сегодняшний день Находка привлекает только красивой природой. Комплексное создание велосипедной и пешеходной инфраструктуры с комфортным и грамотным исполнением, очень повлияет на решение туриста посетить славный город Находка, что позволит ему посещать заведения в городе а не только на пляжных территориях.

9. ЗАГРУЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Городской транспорт в утренние и вечерние часы перегружен. Состояние людей в этом транспорте не очень комфортное (давка, запахи, духота, заболевания). Как чудесно будет утром прокатиться на велосипеде на свежем воздухе, разбудить организм и энергично начать свой день! не тратить времени на ожидание общественного транспорта.

АКТУАЛЬНОСТЬ

- ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ТУРИЗМ
- БЕЗОПАСТНОСТЬ

ДЛЯ КОГО?














ОБЩИЙ ПЛАН ПРЕДЛАГАЕМОГО ВЕЛО МАРШРУТА


НАЧАЛО :сквер в Южном
(ул. Спортивная- район Находка-Мега

Конечная точка «Морской сквер (ост. Волна)

точки городской инфраструктуры потенциального интереса как туристические и зоны отдыха жителей
(Городской парк, ул. Ленинская, видовые площадки, район озера Соленого, Скорбящая Мать, пляж Волна)

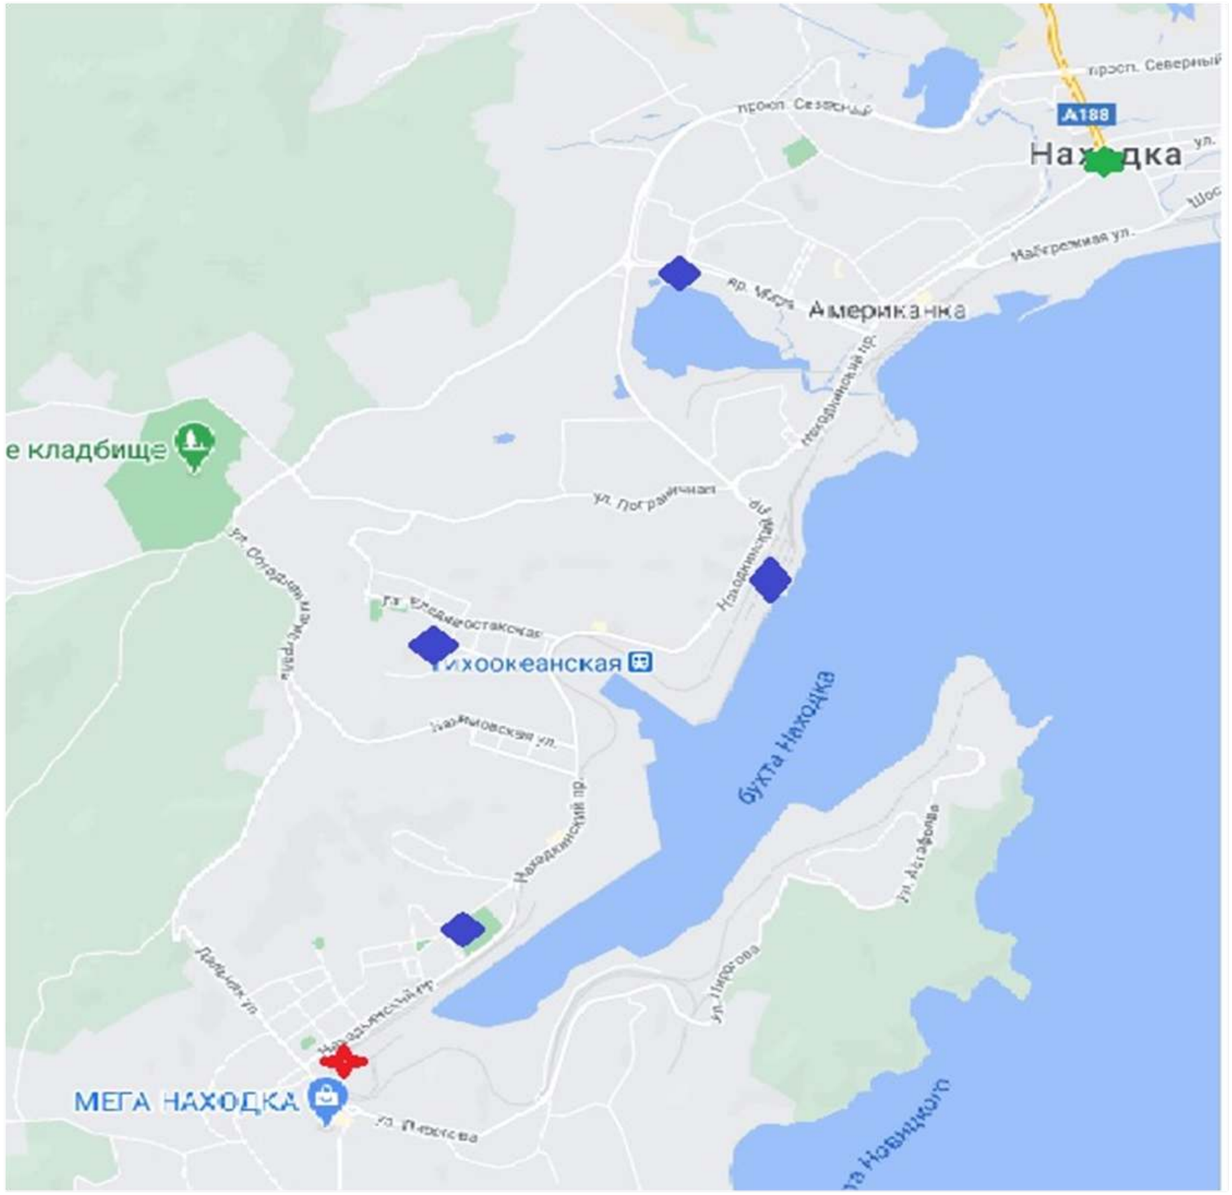

ЧАСТЬ 1. УЧАСТОК ОТ СКВЕРА В РАЙОНЕ НАХОДКА – МЕГА ДО ГУМА ОБЩИЙ ВИД.

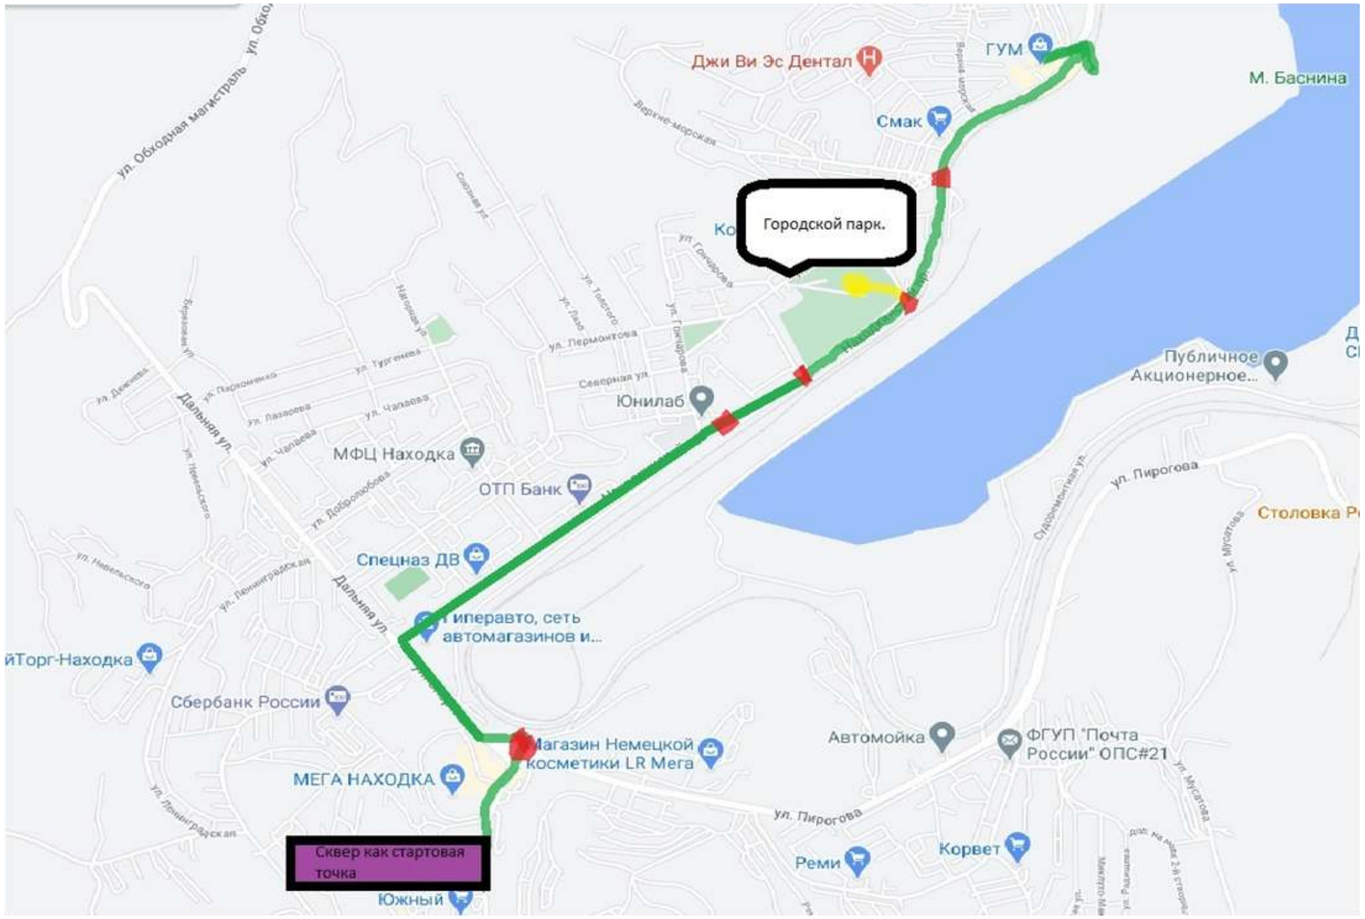



ЧАСТЬ 1. УЧАСТОК ОТ СКВЕРА В РАЙОНЕ НАХОДКА – МЕГА ДО ГУМА

ОБЩИЙ ВИД.







ЧАСТЬ 1. УЧАСТОК ОТ СКВЕРА В РАЙОНЕ НАХОДКА – МЕГА ДО ГУМА

ОБЩИЙ ВИД.








ЧАСТЬ 1. УЧАСТОК ОТ СКВЕРА В РАЙОНЕ НАХОДКА – МЕГА ДО ГУМА


ОБЩИЙ ВИД.

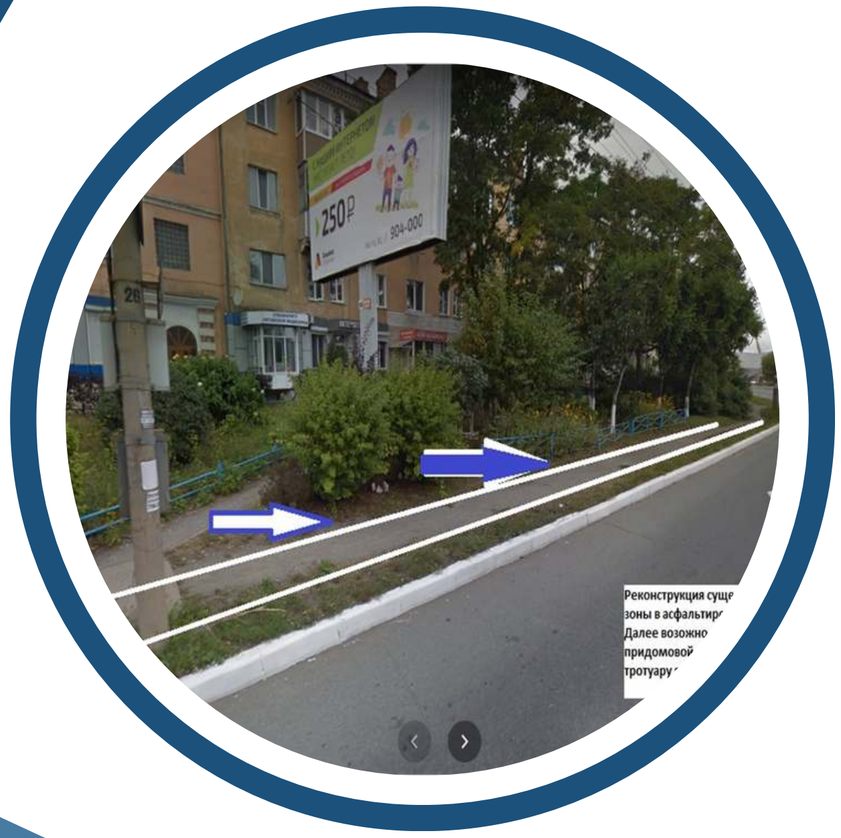





ЧАСТЬ 2.УЧАСТОК ОТ С ГУМА ДО ПЛ. СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

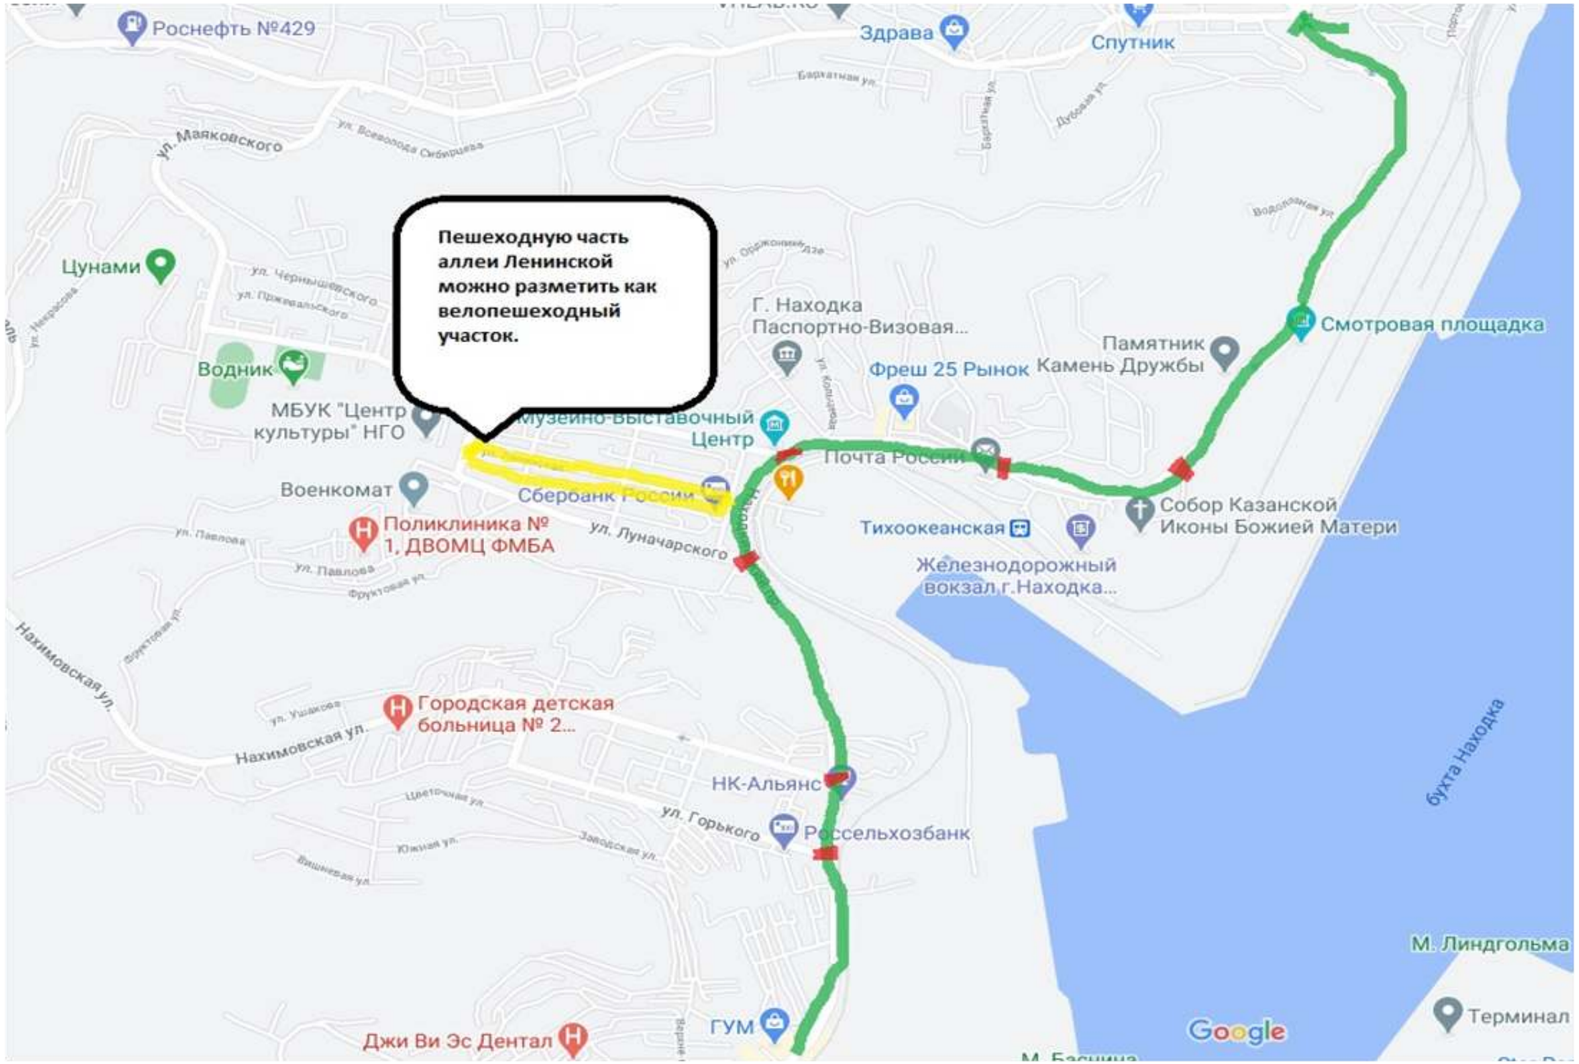


ЧАСТЬ 3.УЧАСТОК ОТ ПЛ. СОВЕРШЕННОЛЕТИЯДО ОСТ. ВОЛНА (МОРСКОЙ СКВЕР)

ДАННЫЙ МАРШРУТ ПРОХОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД.

ПО ВРЕМЕНИ МАРШРУТ ЗАЙМЕТ ОТ 60 ДО 120 МИНУТ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ОПЫТ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСК (ВЕЛОСИПЕДНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ)

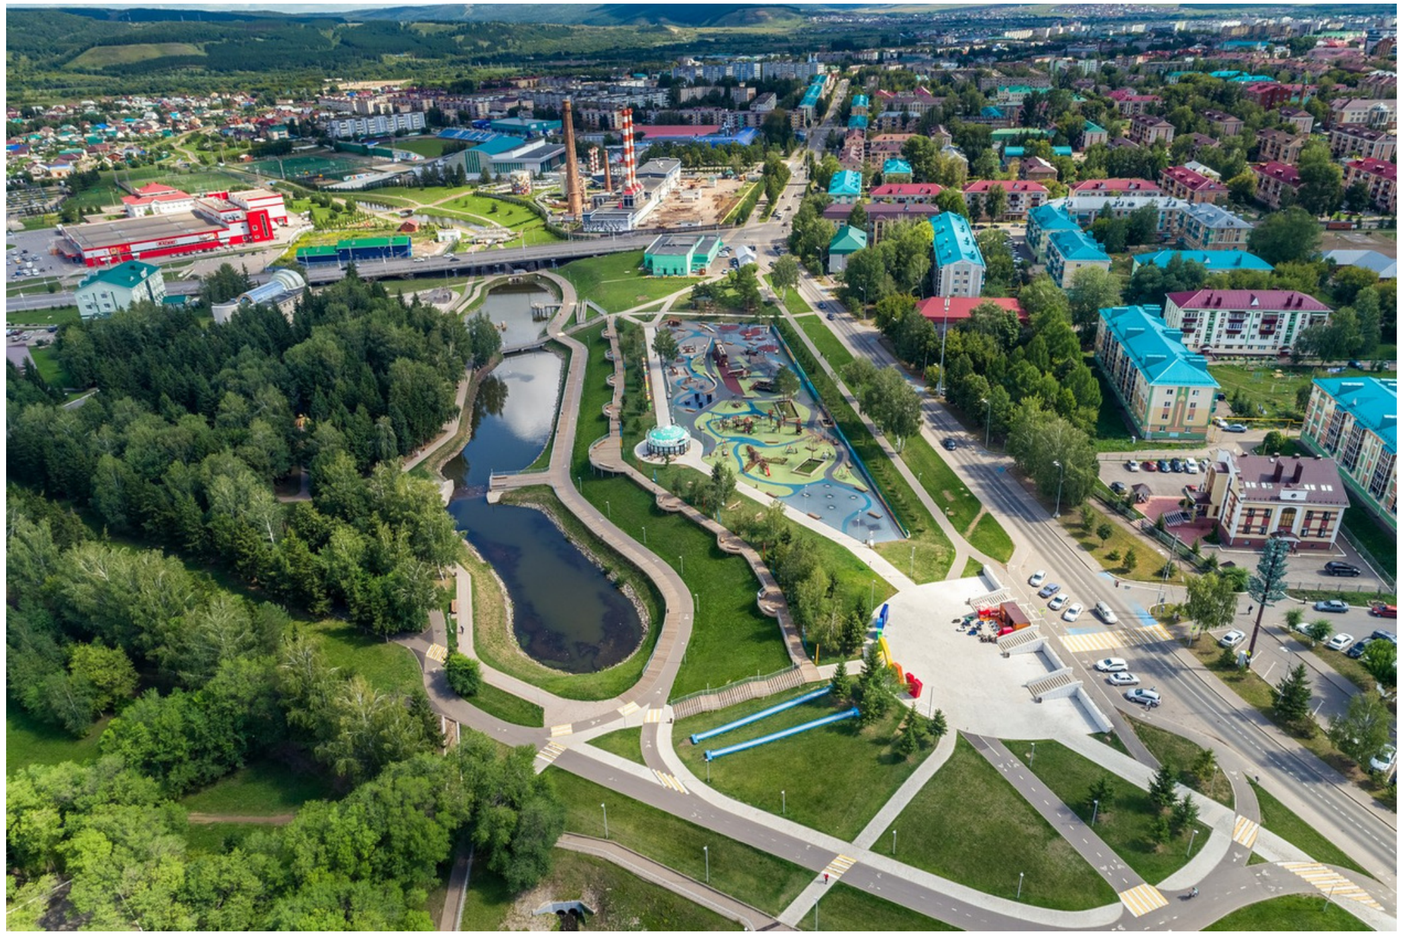

ЧТО ПЫ ПОЛУЧИМ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?

- СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ НА ДОРОГЕ И ДТП
- УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПОСЕЩЕНИЮ ГОРОДА ТУРИСТАМИ
- СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ТРУДОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
- ДОСТУПНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ДЛЯ МАМ С КОЛЯСКАМИ И ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ
- УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАВЕДЕНИЙ (КАФЕ, МАГАЗИНОВ, ЦЕНТРОВ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ) НА ВСЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА
- УМЕНЬШИМ ОТТОК ИЗ ГОРОДА АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ И СПЕЦИАЛИСТОВ С СЕМЬЯМИ
- РАЗГРУЗИМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
- РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
- СОЗДАДИМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ВОЙТИ В ТОП 10 ГОРОДОВ РОССИИ
- ВОЙДЁМ В ИСТОРИЮ РОССИИ КАК ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОРОД С РАЗВИТОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.

ИЗДАНИЕ
«ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА», 1891 ГОД:

«ЕСТЬ НЕЧТО ТАИНСТВЕННОЕ В БЕСШУМНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ВЕЛОСИПЕДИСТА, КОГДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ПРОНОСИТСЯ МИМО И ИСЧЕЗАЕТ».

Приложение № 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов
по итогам выездов
с 14.08.2023 года
по 15.09.2023 года

Активность муниципалитетов 14.08.2023 – 31.08.2023 г.

Количество чек-листов – 122

Количество МО - 25

Топ 5 МО по количеству заполненных чек-листов:

1. Шкотовский округ
2. Партизанск
3. Кировский район
4. Находка
5. Владивосток

Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству заполненных чек-листов в **августе**:

1. Леонова Ю.В. – 14 чек-листов
2. Васильева Г.В. – 10 чек-листов
3. Чигринская Н.В. – 9 чек-листов
4. Белобородова Ю.В. – 5 чек-листов
5. Подшивалова Ю.В. – 3 чек-листа


   Карапетян К.К. – 3 чек-листа

   Нагин С.Ю. – 3 чек-листа


100% - выполнение работ по объектам АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
1	Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»	Сквер в районе Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру	г. Находка, примерно в 250 метров от направления на северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова 2	**100%**	Ведутся дополнительные работы по установке видеонаблюдения.	 
2	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды (ФКГС)»	Сквер Молодежный	г. Находка, ул. Дзержинского 1	**100%**		  
3	Губернаторская программа "1000 дворов"	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 14.	**100%**		  
4	Комплексное развитие сельских территорий	Установка детской игровой площадки	п. Душкино (между домами Ускова 9 и Беляева 22)	**100%**		  

100% - выполнение работ по объектам АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

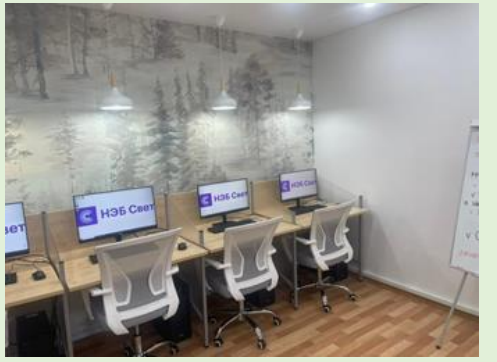№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
5	Национальный проект "Формирование комфортной среды (ФКГС)"	Сквер Школьный, 2 этап	г. Находка, ул. Постышева, д.43	**100%**		
6	Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Центральная библиотечная система" НГО Центральная детская и юношеская библиотека по ул. Дзержинского 12	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 12	**100%**	  	
7	Национальный проект «Культура»	МБУК «Центральная библиотечная система» НГО Детская библиотека № 10	Г. Находка, ул. Юбилейная, д. 8	**100%**	 	

100% - выполнение работ по объектам АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

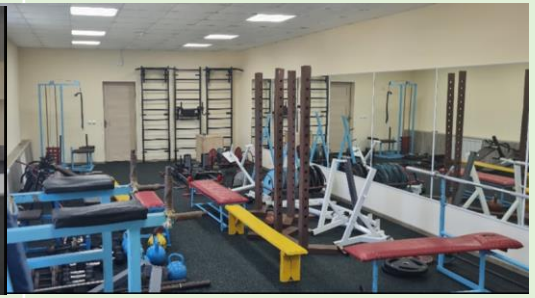№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
8	Национальный проект «Культура»	МБУДО «Детская школа искусств № 5»	г. Врангель, ул. Невельского 2	**100%**	  	
9	Инициативное бюджетирование «Твой проект»	Ремонт МАУ Спортивная школа «Ливадия» НГО, спортивный зал	п. Ливадия, ул. Заводская, 2	**100%**	 	

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Ремонт площадки у памятника «Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
Адрес: С. Душкино ул. Беляева, 2а
Срок сдачи: **сентябрь 2023 г.**
Дата выезда: **04.09.2023г.**

Качество выполненных работ - **4/5**
Готовность объекта - **75% и выше**
Численность рабочих и техники на объекте **– 3ч. и 2 т.**
Оценка работы сотрудника администрации муниципалитета, координирующего выезд - **5/5**

Замечание:
Единственное замечание - на некоторых бордюрах есть сколы. Возможно, подрядчик их устранит





Фотоотчет общественных наблюдателей

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Обустройство ливневых стоков
Адрес: ул. Набережная с. Анна
Срок сдачи: **сентябрь 2023 г.**
Дата выезда: **04.09.2023г.**

Качество выполненных работ - **4/5**
Готовность объекта – **работы завершены**
Численность рабочих и техники на объекте **– 0**
Оценка работы сотрудника администрации муниципалитета, координирующего выезд - **5/5**

Комментарий:
Работы завершены, устраняются недостатки



Фотоотчет общественных наблюдателей

Объекты в процессе работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32
Дата выезда **24.08.2023** и **08.09.2023**





Качество выполненных работ – 5/5

Готовность объекта – 50% **(на 24.08.2023)**

Проводятся работы по укладке фундамента, бетонированию основания, дренажной системы и канализации.

На площадке аккуратно уложены строительные материалы.

Присутствовали 12 рабочих, 4 ед. техники.









Объекты в процессе работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.


Находка

Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова 2
Дата выезда **11.09.2023**



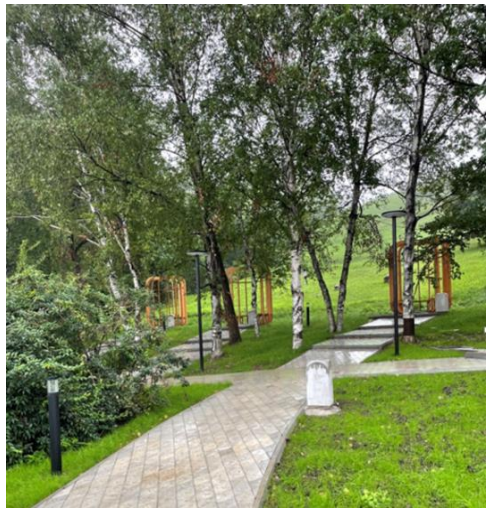



Качество выполненных работ – 5/5

Готовность объекта – 100%

Работы на объекте завершены, рабочих и техники нет.

Замечания:

В связи с большим количеством осадков накануне выезда ливнестоки переполнены, в сквере имеются лужи.

Часть брусчатки около ливнестока провалилась.

Необходимо выполнить ремонт данного участка.







Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира
Дата выезда **01.09.2023**





Качество выполненных работ – 5/5

Готовность объекта – 70%

Замечания:

Обнаружено что информационные стенды на детской площадке в количестве 2-х штук были повреждены вандалами (сорвана наклейка информационная).

Предложения:

Предлагается планировать до проведения работ в первую очередь, подключать объекты строек к видео наблюдению, это позволит снизить риск повреждения объекта и имущества, а также послужит социальным вовлечением жителей города в процесс стройки через онлайн трансляцию.

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Капитальный ремонт помещений, части фасада МБУК «ГКГ Вернисаж»

Национальный проект «Культура»

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 22
Дата выезда **07.09.2023**

Качество выполненных работ – 5/5


Готовность объекта – 95%


Недочетов не выявлено.


Уложена плитка в санузлах, также в санузлах происходит подготовка к установке потолочной системы Армстронг.

Окрашены стены в помещения раздевалки, коридора и зале творческой гостиной.


В малом и большом зале работы, а также фондохранилище работы завершены.

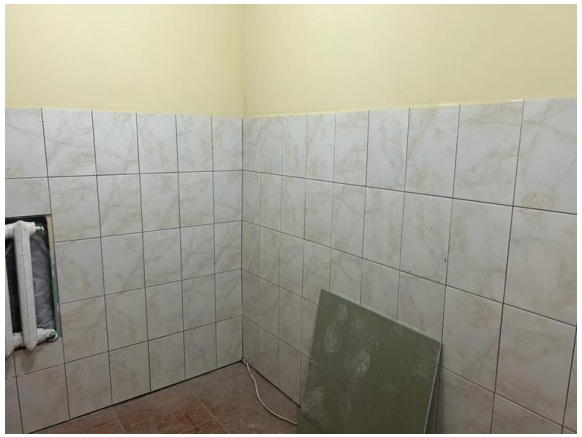

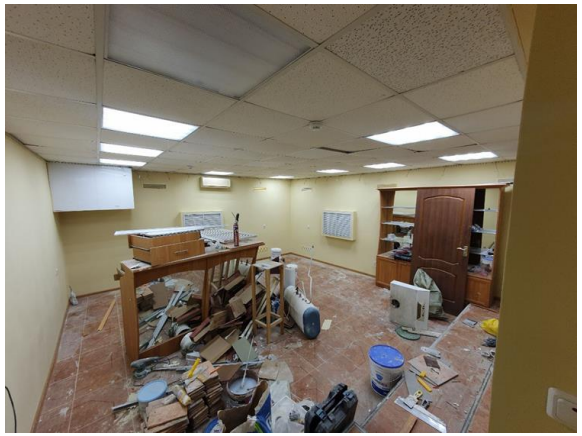

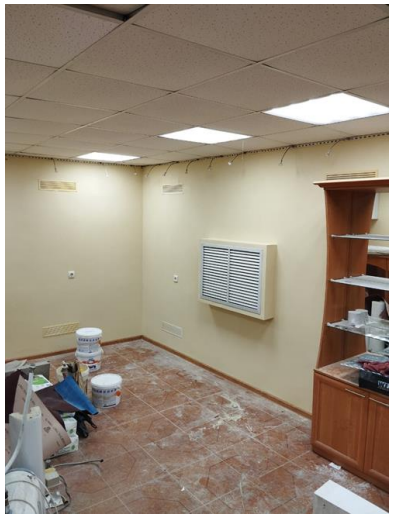



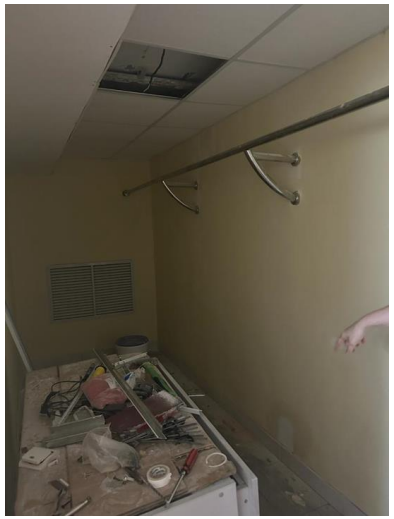

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова»

Национальный проект «Культура»

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32
Дата выезда **07.09.2023**

Качество выполненных работ – 4/5

Готовность объекта – 70%


На входе имеется брендирование. Работы с фасадом завершены. Завершен монтаж системы отопления. Идут отделочные работы внутри помещения. Установлены новые двери. Установлены окна в помещениях звукооператорской и светооператорской. ремонт в этих комнатах завершен. Работы по установке вентиляции выполнены на 80%.


Замечания:

Имеется ряд недочетов – местами краска легла неровно, имеются следы ржавчины от установленных металлических конструкций. Для сохранения фасада необходимо удлинить трубу водостока.






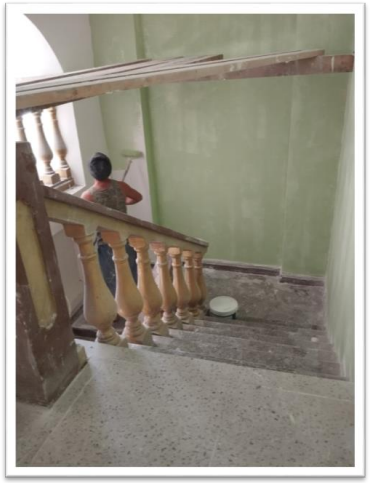

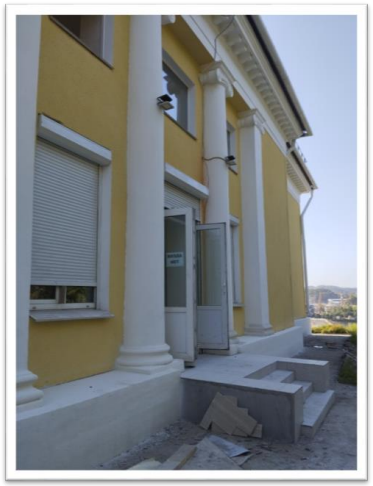



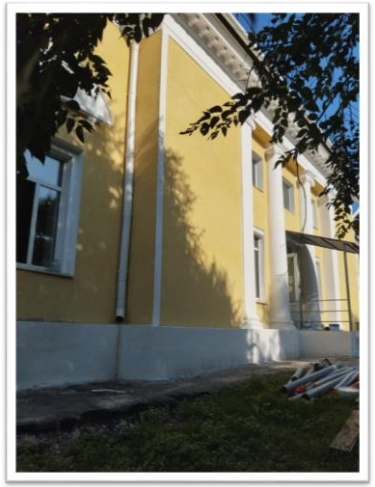

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.


Находка

Капитальный ремонт здания, фасада, цокольного этажа МБУ ДО «ДШИ № 1»

Национальный проект «Культура»

г. Находка, ул. Владивостокская 12
Дата выезда **07.09.2023**



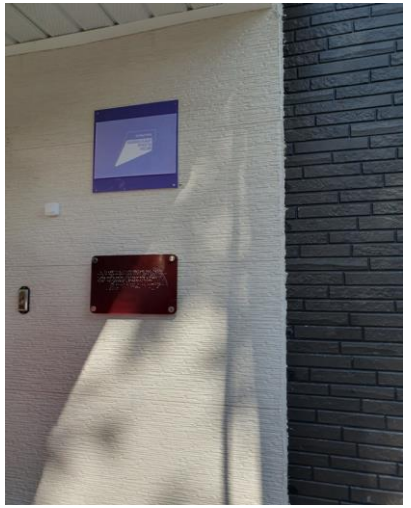

Качество выполненных работ – 4/5

Готовность объекта – 99%


Фасад входного крыльца полностью переделан.

Установлено на входе и внутри помещения брендирование, также есть табличка для людей с ограниченными возможностями.

Отделка коридоров, лестничных пролетов, помещений завершена.

Классы очень красивые после ремонта, уютно, чисто.

Общий объем выполнения: 1й контракт - 100%, ведутся работы по устранению недостатков, 2й контракт – 100%, работы приняты.

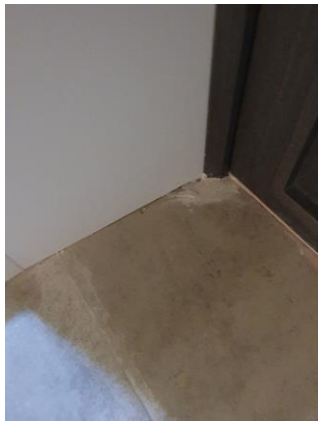





Замечания:

Ремонт на лестничных пролетах завершен, имеются неаккуратно сделанные стыки/швы.

В некоторых помещениях необходимо обратить внимание на повышенную влажность, плесень.





Объекты в процессе работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник»

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Владивостокская, 56
Дата выездов **24.08.2023** и **08.09.2023**

Качество выполненных работ – 5/5

Готовность объекта – 75%

Уложен первый слой асфальтового покрытия на беговой дорожке (северная, южная сторона), стоянке, проход в главный корпус.

На легкоатлетической (малой) беговой дорожке выполнены 100% демонтажные работы старого асфальтового покрытия, уплотнение щебнем.

Колодцы установлены 100%, лоток выставлен на 100%.

Леерное ограждение смонтировано на 45%.
Установка бордюра – 95%.

Произведена обратная засыпка пазух траншеи (благоустройство территории черноземом).

Установлены ливневые решётки.













Объекты в процессе работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Приобретение и установка модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2»

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Нахимовская 21А
Дата выезда **17.08.2023** и **08.09.2023**

Качество выполненных работ – 5/5

Готовность объекта – 42% **(на 17.08.2023)**





Замечания:

Выполнена по периметру дренажная система.

Возведено фундаментное основание.

Собран металлокаркас на 90%.

Частично нанесена огнезащита.

На момент посещения 17.08.2023 рабочие отсутствовали в связи с погодными условиями, трудности в нанесении огнезащиты – влажный металл).

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Ливадия

Обустройство стадиона
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А
Дата выезда **04.09.2023**

Качество выполненных работ – 3/5

Готовность объекта – 85%

Замечания:



Ограждение и паспорт объекта отсутствуют.

При осмотре обнаружены дефекты бордюр и покрытия спортивной площадки.

Примыкание бордюр к дорожке выполнено с нарушениями.

Окрашивание спортивных тренажеров произведено с дефектами, так же необходимо проверить правильность их установки.

На объекте присутствует строительный мусор.

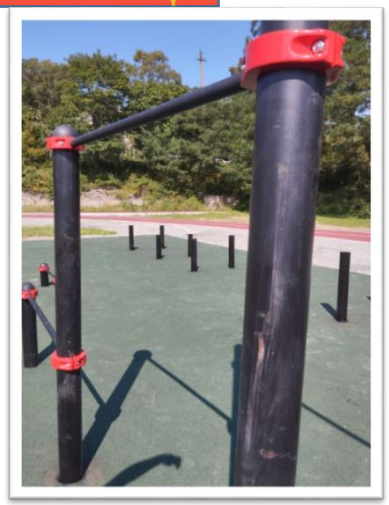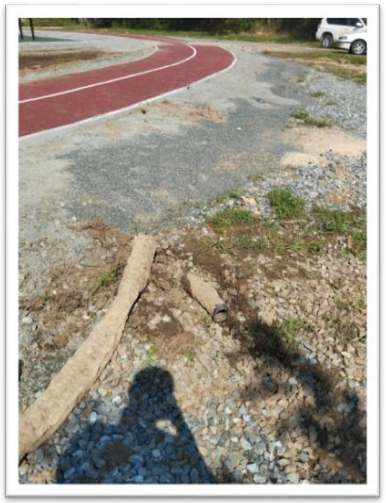



Объекты в процессе работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Находка

Тропа здоровья
В рамках программы **«Твой проект»**
г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно в 25 м)
Дата выезда **24 и 30.08.2023**

Качество выполненных работ - **3/5**
Готовность объекта – **75% и выше**
Оценка работы сотрудника администрации муниципалитета, координирующего выезд - **5/5**

Замечания:
- есть места, где покрытие уложено ненадёжно (шатается и можно споткнуться);

- фигура семьи из дерева выполнена неаккуратно (стыки фанеры с отверстием – нет плотного соединения);

- имеются места на дорожках, где подразмяло песок

Предложения:
Справа или слева на входной деревянной арке предлагается добавить каркас под баннер и афиши для информирования посетителей о мероприятиях на тропе






Приложение № 4

Брендирование национальных проектов и объектов плана социального развития центров экономического роста

Национальные объекты

№п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес расположения объекта	Паспорт/брендирование	Комментарии
Национальные проекты					
1	Национальный проект "Культура"	МБУ ДО "**Городская детская хоровая школа**"	г. Находка, ул. Пугачёва, 2А	брендирование есть	**на информац.стенде логотип проекта ("Луч возможностей") развернут в другую сторону** 
2	Национальный проект "Культура"	МБУ ДО "**Детская художественная школа**"	г. Находка, ул. Луначарского, 15	брендирование есть	
3	Национальный проект "Культура"	МБУК "**Музейно-выстовочный центр г. Находка**"	г. Находка, ул. Владивостокская, 6	брендирование есть	
4	Национальный проект "Культура"	МБУК "ГКГ **Вернисаж**"	г.Находка, ул. Находк.пр-т, 22	паспорта объекта нет, брендирование на фасаде не установлено	работы по объекту заканчиваются в сентябре, как только объект сдадут, табличку с брендированием установят
5	Национальный проект "Культура"	МБУК "**Театр кукол** им. Г.С.Анисимова"	г. Находка, ул. Находк.пр-т, 32	паспорта объекта нет, брендирование на фасаде не установлено	работы по объекту заканчиваются в декабре, как только объект сдадут, табличку с брендированием установят

6	Национальный проект "Культура"	МБУ ДО "**ДШИ №1**"	г. Находка, ул. Владивостокская, 12	брендирование объекта есть	
7	Национальный проект "Культура"	МБУДО "**ДШИ №5**"	п. Врангель, ул. Невельского, 2	брендирование объекта есть	
8	Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Цент.библ.система" **Центр-ая детская и юнош.библиотека**	г. Находка, ул.Дзержинского 12	брендирование объекта есть	
9	Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Цент.библ.система" **Детская.библиотека №10**	г. Находка, ул. Юбилейная 8	брендирование объекта есть	 
10	Национальный проект "Культура"	Кап.ремонт кровли и внутренних помещений МАУК "ЛДК" НГО с/п "Клуб с. Анна"	с. Анна, ул. Нагорная, д .1	паспорт объекта объекта есть	
11	Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"	**сквер в районе Камень Дружбы**	г. Находка, примерно в 250 м от направления на северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова, 2	брендирование объекта нет	

12	Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"	**сквер Озерный бульвар**	г.Находка, ул. Озерный бульвар	брендирование есть	**на информац.стенде логотип проекта ("Луч возможностей") развернут в другую сторону**	
13	Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"	**сквер Школьный**	г. Находка, ул. Постышева 43	брендирование есть	**на информац.стенде логотип проекта ("Луч возможностей") развернут в другую сторону**	
14	Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"	**Видовая площадка №2**	г. Находка, примерно в 90 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная 10)	брендирование есть	**на информац.стенде логотип проекта ("Луч возможностей") развернут в другую сторону**	 
15	Муницип.программа "Формирование комфортной городской среды"	**сквер Молодежный**	г. Находка, ул. Дзержинского 1	брендирование есть	**на информац.стенде логотип проекта ("Луч возможностей") развернут в другую сторону**	

Губернаторская программа «1000 дворов»

№п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес расположения объекта	Паспорт/брендирование	Комментарии
Губернаторская программа "1000 дворов"					
1	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридомового проезда	г. Находка, ул Кирова, 11	брендирования нет, в разработке	
2	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	г. Находка, ул. Дзержинского, 16 Б	брендирование есть	
3	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридомового проезда	г. Находка, ул. Озерный бульвар, 7	брендирования нет, в разработке	
4	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридомового проезда	г. Находка, ул. Черняховского, 1	брендирования нет, в разработке	
5	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	г. Находка, ул. Пирогова, 28	брендирование есть	

6	Губернаторская программа "1000 дворов"	Спортивная площадка	г. Находка, ул. Рыбацкая, 17 В	брендирование есть	
7	Губернаторская программа "1000 дворов"	Спортивная площадка	г. Находка, ул. Пирогова, 52	брендирование есть	
8	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 11	брендирование есть	
9	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, 1	брендирование есть	

План социального развития центров экономического роста

№п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес расположения объекта	Паспорт/брендирование	Комментарии
План социального развития центров экономического роста					
1	План социального развития центров экономического роста	кап.ремонт спортивного ядра **стадиона "Водник"**	г. Находка, ул. Владивостокская, 56	паспорт объекта есть /информационного щита нет	
2	План социального развития центров экономического роста	Физкультурно-оздоровительный комплекс (**ФОК**)	г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя 30	паспорт объекта есть /информационного щита нет	
3	План социального развития центров экономического роста	Приобритение и установка модульного спортивного зала МАУ **"СОШ № 2"**	г. Находка, ул. Нахимовская 21А	паспорт объекта есть /информационного щита нет	
4	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство прилегающей территории **оз. Соленое** (этап 1.1)	г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира	паспорт объекта есть /информационного щита нет	

5	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Комсомольская, д.34	нет информационного щита
6	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, д.36А	нет информационного щита
7	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Верхне-Морская, д.106	нет информационного щита
8	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пирогова, 46	нет информационного щита
9	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Рыбацкая, 6	нет информационного щита
10	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9	нет информационного щита
11	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Восточный проспект, д. 6а	нет информационного щита

12	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Анна, Набережная, д. 5	нет информационного щита
13	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 14	нет информационного щита
14	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Невельского, д. 2	нет информационного щита
15	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Приморский проспект, д. 4	нет информационного щита
16	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Приморский проспект, д. 8	нет информационного щита
17	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Приморский проспект, д.2	нет информационного щита
18	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4В	нет информационного щита
19	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Нахимовская, д.39	нет информационного щита

Приложение № 5.

Исполнение бюджета
за период с 01.01.2023г. по 08.09.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Кассовый план (год)	Январь-сентябрь		в том числе сентябрь, по состоянию на 08.09.2023		% исп. на 08.09.2023	Кассовый план		
					Кассовый план	Финансирование	Кассовый план	Финансирование		Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка)	851	0409	0680392450	99 712 296,63	68 422 012,22	47 145 604,73	21 276 407,49	0,00	47,28	21 090 699,45	10 199 584,96	0,00
краевой бюджет				98 208 000,00	67 168 037,85	46 768 439,88	20 399 597,97	0,00	47,62	20 921 973,85	10 117 988,30	0,00
местный бюджет (софинансирование)				792 000,00	541 677,74	377 164,85	164 512,89	0,00	47,62	168 725,60	81 596,66	0,00
местный бюджет (дополнительные)				712 296,63	712 296,63	0,00	712 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований	851	0502	1290192280	40 975 000,00	40 975 000,00	40 975 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				40 647 200,00	40 647 200,00	40 647 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				327 800,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находке)	851	1102	10903R5059	330 135 185,86	126 733 361,60	81 769 340,72	45 183 999,66	219 978,78	24,77	84 774 131,46	118 228 932,17	398 760,63
федеральный бюджет				325 670 980,01	124 697 947,00	80 183 566,33	44 514 380,67	0,00	24,62	83 926 390,15	117 046 642,86	
местный бюджет (софинансирование)				3 289 605,85	1 259 575,23	809 935,02	449 640,21	0,00	24,62	847 741,31	1 182 289,31	
местный бюджет (дополнительные)				1 174 600,00	775 839,37	775 839,37	219 978,78	219 978,78	66,05	0,00	0,00	398 760,63
ВСЕГО РАСХОДОВ:				**470 822 482,49**	**236 130 373,82**	**169 889 945,45**	**66 460 407,15**	**219 978,78**	**36,08**	**105 864 830,91**	**128 428 517,13**	**398 760,63**
федеральный бюджет				325 670 980,01	124 697 947,00	80 183 566,33	44 514 380,67	0,00	24,62	83 926 390,15	117 046 642,86	0,00
краевой бюджет				138 855 200,00	107 815 237,85	87 415 639,88	20 399 597,97	0,00	62,95	20 921 973,85	10 117 988,30	0,00
местный бюджет (софинансирование)				4 409 405,85	2 129 052,97	1 514 899,87	614 153,10	0,00	34,36	1 016 466,91	1 263 885,97	0,00
местный бюджет (дополнительные)				1 886 896,63	1 488 136,00	775 839,37	932 275,41	219 978,78	41,12	0,00	0,00	398 760,63

Исполнение бюджета в рамках реализции мероприятий "Благоустройство сельских территорий за период с 01.01.2023г. по 08.09.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	Кассовый план (год)	Январь-сентябрь		В том числе сентябрь,по состояние 08.09.2023		% исп., на 08.09.2023
						Кассовый план	Финансирование	Кассовый план	Финансирование	
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы"	851	0503	2600000000	000	6 754 081,25	6 754 081,25	2 389 459,69	4 364 621,56	0,00	35,38
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство сельских территорий"	851	0503	2690100000	000	6 754 081,25	6 754 081,25	2 389 459,69	4 364 621,56	0,00	35,38
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий)	851	0503	26901L5762	000	6 584 746,71	6 584 746,71	2 389 459,69	4 195 287,02	0,00	36,29
Дополнительные расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий)	851	0503	26901Д5762	000	169 334,54	169 334,54	0,00	169 334,54	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:					6 754 081,25	6 754 081,25	2 389 459,69	4 364 621,56	0,00	35,38
федеральный бюджет					4 517 136,26	4 517 136,26		2 877 966,90		0,00
краевой бюджет					92 186,45	92 186,45		58 734,02		0,00
местный бюджет (софинансирование)					1 975 424,01	1 975 424,01		1 258 586,10		0,00
местный бюджет (дополнительные)					169 334,54	169 334,54	0,00	169 334,54	0,00	0,00

Исполнение бюджета в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"
за период с 01.01.2023г. по 08.09.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Кассовый план (год)	Январь-сентябрь		В том числе сентябр,ь по состоянию на 08.09.2023		% исп., на 08.09.2023	Кассовый план
					Кассовый план	Финансирование	Кассовый план	Финансирование		Октябрь
проекты "Благоустройство ул. Набережной в с. Анна", "Тропа здоровья"										
Благоустройство	851	0503	0000000000	4 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" **за счет средств краевого бюджета**	851	0503	9999992360	4 752 000,00	2 376 000,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" за **счет средств местного бюджета**	851	0503	99999S2360	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
проекты "Обустройство стадиона в п. Южно-Морском", "Спорт - норма жизни"										
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	851	1100	0000000000	5 895 000,00	5 895 000,00	3 000 000,00	2 895 000,00	0,00	50,89	0,00
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" **за счет средств краевого бюджета**	851	1102	9999992360	5 836 050,00	5 836 050,00	2 970 000,00	2 866 050,00	0,00	50,89	0,00
Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" **за счет средств местного бюджета**	851	1102	99999S2360	58 950,00	58 950,00	30 000,00	28 950,00	0,00	50,89	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:				10 695 000,00	8 295 000,00	3 000 000,00	5 295 000,00	0,00	28,05	2 400 000,00

за период с 01.01.2023г. по 08.09.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Кассовый план (год)	Январь-сентябрь		в том числе сентябрь, по состоянию на 08.09.2023		% исп., на 08.09.2023	Кассовый план		
					Кассовый план	Финансирование	Кассовый план	Финансирование		Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры)	851	0412	11902R5057	195 781 515,15	191 167 288,60	121 104 852,10	70 062 436,50	0,00	61,86	2 977 853,26	1 636 373,29	0,00
Дополнительный расходы на благоустройство прилегающей территории вокруг озера Солёное в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры	851	0412	11902Д5057	755 000,00	755 000,00	32 000,00	723 000,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				193 823 700,00	189 255 615,70	119 893 803,58	69 361 812,13	0,00	61,86	2 948 074,73	1 620 009,57	0,00
местный бюджет (софинансирование)				1 957 815,15	1 911 672,90	1 211 048,52	700 624,37	0,00	61,86	29 778,53	16 363,72	0,00
местный бюджет (дополнительные)				755 000,00	755 000,00	32 000,00	723 000,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта "1000 дворов"	851	0503	21902R5051	106 140 385,27	106 140 385,27	106 140 385,27	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				105 078 981,44	105 078 981,44	105 078 981,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				1 061 403,85	1 061 403,85	1 061 403,85	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Приобретение и установка модульных спортивных залов (МАОУ СОШ №2НГО))	851	0702	05202R505U	40 404 040,40	13 392 871,35	13 392 871,35	0,00	0,00	33,15	27 011 169,05	0,00	0,00
Дополнительные расходы на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Приобретение и установка модульных спортивных залов (МАОУ СОШ №2НГО)) за счёт средств местного бюджнта	851	0702	05202Д505U	783 947,42	463 025,78	783 947,42	0,00	320 921,64	100,00	320 921,64	0,00	0,00
федеральный бюджет				40 000 000,00	13 258 942,64	13 258 942,64	0,00	0,00	33,15	26 741 057,36	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				404 040,40	133 928,71	133 928,71	0,00	0,00	33,15	270 111,69	0,00	0,00
местный бюджет (дополнительные)				783 947,42	463 025,78	783 947,42	0,00	320 921,64	100,00	320 921,64	0,00	0,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находке)	851	1102	10903R5059	328 960 585,86	125 957 522,23	80 993 501,35	44 964 020,88	0,00	24,62	84 774 131,46	118 228 932,17	0,00
Дополнительные расходы на строительство физкультурнр-оздоровительного комплекса в г. Находка в 25 метрах на восток от здания по улице Дальней.30	851	1102	10903Д5059	1 174 600,00	775 839,37	775 839,37	219 978,78	219 978,78	66,05	0,00	0,00	398 760,63
федеральный бюджет				325 670 980,01	124 697 947,00	80 183 566,33	44 514 380,67	0,00	24,62	83 926 390,15	117 046 642,86	
местный бюджет (софинансирование)				3 289 605,85	1 259 575,23	809 935,02	449 640,21	0,00	24,62	847 741,31	1 182 289,31	
местный бюджет (дополнительные)				1 174 600,00	775 839,37	775 839,37	219 978,78	219 978,78	66,05	0,00	0,00	398 760,63
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Капитальный ремонт стадиона "Водник" в г. Находке)	851	1102	10903R505E	35 049 797,98	16 025 566,81	16 025 566,81	0,00	0,00	45,72	8 755 961,54	10 268 269,63	0,00
федеральный бюджет				34 699 300,00	15 865 311,13	15 865 311,14	0,00	0,00	45,72	8 668 401,92	10 165 586,95	
местный бюджет (софинансирование)				350 497,98	160 255,68	160 255,67	0,00	0,00	45,72	87 559,62	102 682,68	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:				**709 049 872,08**	**454 677 499,41**	**339 248 963,67**	**115 969 436,16**	**540 900,42**	**47,85**	**123 840 036,95**	**130 133 575,09**	**398 760,63**
федеральный бюджет				699 272 961,45	448 156 797,91	334 280 605,13	113 876 192,80	0,00		122 283 924,16	128 832 239,38	0,00
местный бюджет (софинансирование)				7 063 363,23	4 526 836,37	3 376 571,77	1 150 264,58	0,00		1 235 191,15	1 301 335,71	0,00
местный бюджет (дополнительные)				2 713 547,42	1 993 865,15	1 591 786,79	942 978,78	540 900,42		320 921,64	0,00	398 760,63

Исполнение бюджета в рамках реализации национальных проектов
за период с 01.01.2023г. по 08.09.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Кассовый план (год)	Январь-сентябрь		в том числе сентябрь, по состоянию на 08.09.2023		% исп., на 08.09.2023	Кассовый план		
					Кассовый план	Финансирование	Кассовый план	Финансирование		Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Национальный проект "Жилье и городская среда" (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды")	**851**	**0503**	**217F000000**	**58 220 184,03**	**57 710 171,77**	**49 857 679,29**	**7 852 492,48**	**0,00**	**85,64**	**510 012,26**	**0,00**	**0,00**
Реализация программ формирования современной городской среды	851	0503	217F255550	45 076 484,04	45 076 484,04	43 466 837,23	1 609 646,81	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
Дополнительные расходв на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета	851	0503	217F2Д5550	13 143 699,99	12 633 687,73	6 390 842,06	6 242 845,67	0,00	48,62	510 012,26	0,00	0,00
федеральный бюджет				43 954 079,58	43 954 079,58	42 384 512,99	1 569 566,61	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				897 022,03	897 022,03	864 990,07	32 031,97	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				225 382,43	225 382,43	217 334,17	8 048,23	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (дополнительные)				13 143 699,99	12 633 687,73	6 390 842,06	6 242 845,67	0,00	48,62	510 012,26	0,00	0,00
Национальный проект "Демография" (Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)")	**851**	**1103**	**107P000000**	**134 984,56**	**134 984,56**	**0,00**	**134 984,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	851	1103	107P550810	134 984,56	134 984,56	0,00	134 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				128 316,32	128 316,32	0,00	128 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				2 618,70	2 618,70	0,00	2 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				4 049,54	4 049,54	0,00	4 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальный проект "Культура" (Региональный проект "Культурная среда")	**857**	**0703**	**027A000000**	**112 394 072,80**	**96 841 450,16**	**90 340 420,27**	**11 965 681,27**	**5 464 651,38**	**80,38**	**11 166 841,75**	**4 385 780,89**	**0,00**
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовавтельных учреждений в сфере культуры(детскийх школ искусств и училищ) музыкальными инструментами. оборудованием и учебными материалами)	857	0703	027A155191	8 970 212,58	8 970 212,58	8 970 212,58	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				8 286 529,16	8 286 529,16	8 286 529,16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				663 172,92	663 172,92	663 172,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				20 510,50	20 510,50	20 510,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств , возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	857	0703	027A155192	36 337 840,53	36 337 840,53	35 013 179,26	5 046 806,80	3 722 145,53	96,35	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				30 373 484,27	30 373 484,27	29 266 247,90	4 218 442,95	3 111 206,58	96,35	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				5 785 425,57	5 785 425,57	5 574 523,41	803 512,93	592 610,78	96,35	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				178 930,69	178 930,69	172 407,95	24 850,92	18 328,17	96,35	0,00	0,00	0,00
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек счет средств бюджетов	857	0801	027A154540	15 315 590,15	15 315 590,15	15 315 590,15	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				306 122,45	306 122,45	306 122,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				9 467,70	9 467,70	9 467,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол	857	0801	027A154560	40 520 186,09	24 967 563,45	21 433 516,38	3 534 047,07	0,00	52,90	11 166 841,75	4 385 780,89	0,00
федеральный бюджет				36 395 519,53	23 130 652,89	20 991 861,40	2 138 791,52	0,00	57,68	8 969 458,29	4 295 408,35	0,00
краевой бюджет				4 000 926,56	1 781 803,23	428 405,33	1 353 397,88	0,00	10,71	2 131 461,96	87 661,37	
местный бюджет (софинансирование)				123 740,00	55 107,33	13 249,65	41 857,67	0,00	10,71	65 921,50	2 711,17	
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	857	0801	027A155130	2 516 067,16	2 516 067,16	2 516 067,16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				2 103 089,38	2 103 089,38	2 103 089,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				400 588,45	400 588,45	400 588,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				12 389,33	12 389,33	12 389,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев	857	0801	027A155900	3 260 596,97	3 260 596,97	1 618 275,42	1 642 321,55	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				3 162 779,06	3 162 779,06	1 520 457,51	1 642 321,55	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				97 817,91	97 817,91	97 817,91	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	857	0801	027A155970	5 473 579,32	5 473 579,32	5 473 579,32	1 742 505,85	1 742 505,85	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет				4 575 166,63	4 575 166,63	4 575 166,63	1 456 497,50	1 456 497,50	100,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет				871 460,31	871 460,31	871 460,31	277 428,10	277 428,10	100,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет (софинансирование)				26 952,38	26 952,38	26 952,38	8 580,25	8 580,25	100,00	0,00	0,00	0,00
Национальный проект "Образование"	**874**	**0702**	**057E000000**	**23 197 815,30**	**12 848 892,16**	**10 687 959,70**	**2 901 281,00**	**740 348,54**	**46,07**	**2 901 281,00**	**4 601 281,00**	**2 846 361,14**
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	874	0702	057EB00000	1 607 815,30	401 281,00	0,00	401 281,00	0,00	0,00	401 281,00	401 281,00	403 972,30
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	874	0702	057EB51790	1 607 815,30	401 281,00	0,00	401 281,00	0,00	0,00	401 281,00	401 281,00	403 972,30
федеральный бюджет				1 575 658,99	393 255,38	0,00	393 255,38	0,00	0,00	393 255,38	393 255,38	395 892,85
краевой бюджет				32 156,31	8 025,62	0,00	8 025,62	0,00	0,00	8 025,62	8 025,62	8 079,45
Региональный проект "Современная школа"	874	1003	057E100000	21 590 000,00	12 447 611,16	10 687 959,70	2 500 000,00	740 348,54	49,50	2 500 000,00	4 200 000,00	2 442 388,84
Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края	874	1003	057E193140	21 590 000,00	12 447 611,16	10 687 959,70	2 500 000,00	740 348,54	49,50	2 500 000,00	4 200 000,00	2 442 388,84
краевой бюджет				21 590 000,00	12 447 611,16	10 687 959,70	2 500 000,00	740 348,54	49,50	2 500 000,00	4 200 000,00	2 442 388,84
ВСЕГО РАСХОДОВ:				**193 947 056,69**	**167 535 498,65**	**150 886 059,26**	**22 854 439,31**	**6 204 999,92**	**77,80**	**14 578 135,01**	**8 987 061,89**	**2 846 361,14**
федеральный бюджет				142 391 843,86	127 944 573,61	122 607 407,46	9 904 870,28	4 567 704,08	86,11	9 362 713,67	4 688 663,73	395 892,85
краевой бюджет				37 712 272,36	26 326 629,50	21 317 680,15	6 619 336,75	1 610 387,42	56,53	4 639 487,58	4 295 686,99	2 450 468,29
местный бюджет (софинансирование)				699 240,48	630 607,81	570 129,59	87 386,61	26 908,42	81,54	65 921,50	2 711,17	0,00
местный бюджет (дополнительные)				13 143 699,99	12 633 687,73	6 390 842,06	6 242 845,67	0,00	48,62	510 012,26	0,00	0,00
